

**Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации**
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Лабораторная работа №2
«Экономика программной инженерии»

Выполнили:
Р3420 Кремпольская Е.А.,
Р3420 Касьяненко В.М.
Факультет: ПИиКТ
Группа: Р3420
Преподаватель: Харитонов А.Е

Санкт-Петербург, 2025

Оглавление

Задание.....	3
Выполнение.....	4
1. Создать учетные записи для всей своей проектной команды.....	4
2. Интегрировать YouTrack с git репозиторием.....	4
3. Настроить интеграцию с электронной почтой.....	6
4. Создать проект с заданным в варианте профилем.....	8
5. Настроить столбцы доски для своего проекта.....	8
6. Создать план работ над проектом и зафиксировать его в YouTrack.....	9
7. Симулировать процесс разработки проекта.....	12
8. После завершения снять метрики проекта и предоставить отчет.....	13
Вывод.....	15

Задание

Зарегистрироваться для использования бесплатной облачной версии ПО YouTrack для управления своим программным проектом:

1. Создать учётные записи для всей своей проектной команды.
2. Интегрировать YouTrack с git репозиторием.
3. Настроить интеграцию с электронной почтой.
4. Создать проект с заданным в варианте профилем (Scrum / Kanban).
5. Настроить столбцы доски для своего проекта.
6. Создать план работ над проектом и зафиксировать его в YouTrack (создать спринты, релизы и задачи, а также необходимые для работы ветви в репозитории).
7. Симулировать процесс разработки проекта, постепенно закрывая "выполненные" задачи и открывая новые.
8. После завершения снять метрики проекта и предоставить отчет, содержащий описание процесса конфигурации и настройки, описание выбранного workflow, и сформированные с помощью YouTrack отчеты, отражающие статистику работы над проектом. Обязательно должны быть приведены: отчет по исполнителям, burndown-диаграмма, отчет по времени, диаграмма Гантта.

Выполнение

1. Создать учетные записи для всей своей проектной команды.

9 Users ⓘ

This list displays all of the user accounts that are registered in YouTrack. The search box provides query completion to help you choose from available users.

[New user...](#)

☐ Full Name ↕	Username ↕
☐ guest banned	guest
☐ Manager	Manager
☐ Analyst_1	Analyst_1
☐ Front-ender_1	Front-ender_1
☐ Front-ender_2	Front-ender_2
☐ Back-endер_1	Back-endер_1
☐ Back-endер_2	Back-endер_2
☐ Tester_1	Tester_1
☐ Tester_2	Tester_2

2. Интегрировать YouTrack с git репозиторием.

VCS Integration ⓘ

Configure integrations between YouTrack projects and repositories that are hosted in supported Git-based version control systems. These integrations enable the following features for commits that reference issues in YouTrack:

- Show VCS changes with links to related commits and pull requests in the issue activity stream
- Apply commands to update issues when VCS changes are processed by YouTrack

[Learn more →](#)

[New VCS integration...](#)

[Hide details](#)

YouTrack Project	Repository
GitHub	github.com
Site	gh/economiclab2

GitHub Server

<https://github.com>

This connection lets you map YouTrack projects to repositories that are hosted on GitHub. The connection to this service is predefined and requires no additional configuration.

Webhooks / Manage webhook

Settings

Recent Deliveries

We'll send a POST request to the URL below with details of any subscribed events. You can also specify which data format you'd like to receive (JSON, x-www-form-urlencoded, etc). More information can be found in [our developer documentation](#).

Payload URL *

https://368383.youtrack.cloud/api/vcsHooksReceiver/github/465-5

Content type *

application/json

There is currently a secret configured for this webhook. If you've lost or forgotten this secret, you can change it, but be aware that any integrations using this secret will need to be updated.

Change secret

SSL verification

By default, we verify SSL certificates when delivering payloads.

Enable SSL verification

Disable (not recommended)

Which events would you like to trigger this webhook?

Just the push event.

Send me everything.

Let me select individual events.

Webhooks / Manage webhook

Settings	Recent Deliveries
	✓ 0aaf2b78-c14f-11ef-925d-8d1c9ab2022f issues.deleted
	✓ f367790c-c14e-11ef-8a59-8feebe558bfe issues.opened
	✓ 44619370-c14e-11ef-8c94-eac388028a5c ping

3. Настроить интеграцию с электронной почтой.

Global Settings ⓘ

Server Configuration License Details Internationalization **Notifications** Optional Features

Connect to services that deliver notifications from YouTrack. You can also customize the messages to match your company style for tone and voice.

Important! If the connection to the email service is deactivated or misconfigured, users won't receive invitations to register new accounts, verify email addresses, or passwords. [Learn more](#) →

Email Server

☒ Email notifications

Configuration **Default** ▾

Sender name

Sets the default sender name for email notifications that are sent from your YouTrack instance. If empty, YouTrack uses the full name of the user who triggers the notification.

Reply-to address

An optional address to which email replies are sent

Notification Templates [Configure notification templates](#)

Customize the messages sent by YouTrack

VCS Integration ⓘ

Configure integrations between YouTrack projects and repositories that are hosted in supported Git-based version control systems. These integrations enable the following features for commits that reference issues in YouTrack:

- Show VCS changes with links to related commits and pull requests in the issue activity stream
- Apply commands to update issues when VCS changes are processed by YouTrack

[Learn more](#) →

New VCS integration...



> Hide details

YouTrack Project Repository

GitHub github.com

Site gh/economiclab2

GitHub Server

<https://github.com>

This connection lets you map YouTrack projects to repositories that are hosted on GitHub. The connection to this service is predefined and requires no additional configuration.

Global Settings

Server Configuration License Details Internationalization **Notifications** Optional Features

Connect to services that deliver notifications from YouTrack. You can also customize the messages to match your company style for tone and voice.

Important! If the connection to the email service is deactivated or misconfigured, users won't receive invitations to register new accounts, verify email addresses, or passwords. [Learn more →](#)

Email Server

Notification Templates

Customize messages that are sent from YouTrack to match the communication style used within your organization. Edit the default FreeMarker-based templates to include a custom subject line, change the language, or tailor the message text. [Learn more](#) →

ser who triggers

Issue selected for preview: [No issue](#) ▾

[Reset All to Defaults](#)

> Hide details

Name	Send notification when...
☐ Issue Change	
☐ Duplicate cluster digest	Cluster of issue duplicated
☒ Issue digest	Issue is created or modified
☐ Article Change	
☐ Article digest	Article is created or modified

Email

[YouTrack, Updated] Issue S-4: test

Issue was updated by you in project Site

★ S-4 test

Created by you

Y

Youtrack-Lab2

[YouTrack, Created] Issue S-9: Test issue webhook

19:36

New issue in project Site

★

S-9 Test issue webhook

Created by you

No description

Star

Priority

Normal

Assignee

Not assigned

Kanban State

Ready to pull

Predict time usage

?

Stage

Backlog

Actual time usage

?

You (Manager) received this message because you subscribe to notification events for the Star tag. To unsubscribe, you can [mute notifications for this issue](#) or [edit your notification preferences](#).


Y

Youtrack-Lab2


[YouTrack, Deleted] Issue S-9: Test issue webhook

19:43

4. Создать проект с заданным в варианте профилем.

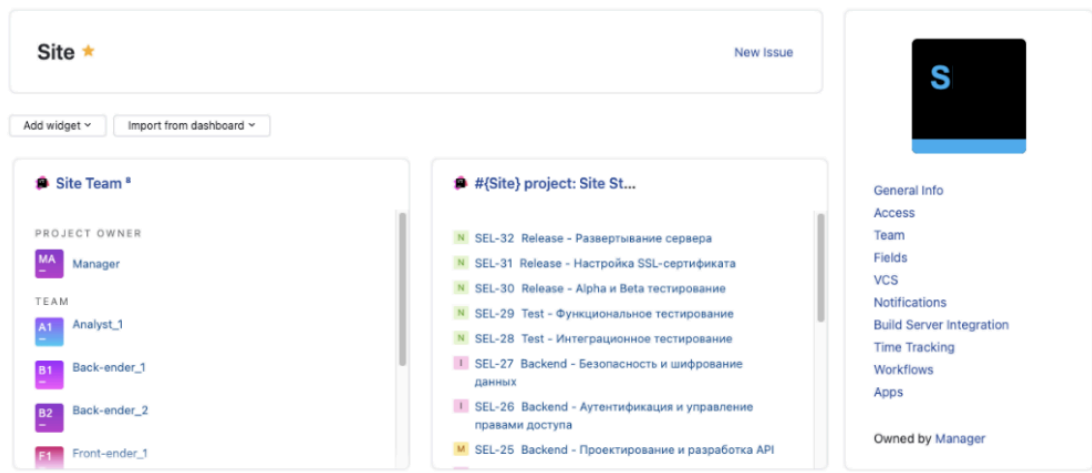

5. Настроить столбцы доски для своего проекта.

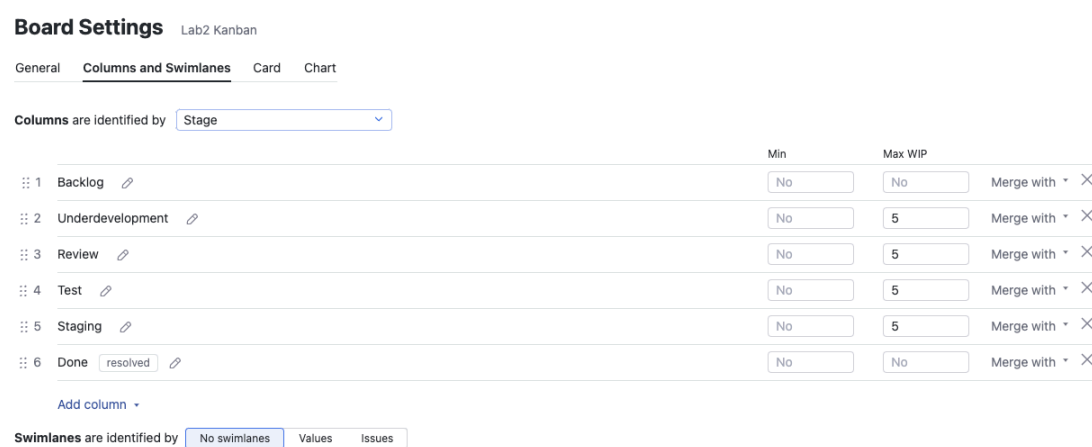

6. Создать план работ над проектом и зафиксировать его в YouTrack

My Dashboard ▾ ⋮

 #issues sort by: updated ²⁰

-  SEL-32 Release - Развертывание сервера
-  SEL-31 Release - Настройка SSL-сертификата
-  SEL-30 Release - Alpha и Beta тестирование
-  SEL-29 Test - Функциональное тестирование
-  SEL-28 Test - Интеграционное тестирование
-  SEL-27 Backend - Безопасность и шифрование данных
-  SEL-26 Backend - Аутентификация и управление правами доступа
-  SEL-25 Backend - Проектирование и разработка API
-  SEL-24 Backend - Проектирование и настройка базы данных
-  SEL-23 Frontend - Панель управления пользователем
-  SEL-22 Frontend - Страница "Документации"
-  SEL-21 Frontend - Страница "Центр поддержки"
-  SEL-20 Frontend - Страница "Продуктов"
-  SEL-19 Frontend - Страница "Услуг"
-  SEL-17 Frontend - Страница "Главная"
-  SEL-18 Frontend - Страница "Входа/Регистрации"
-  SEL-16 Настройка хостинга и домена
-  SEL-15 Разрешение на обработку данных
-  SEL-14 Выбор технологий
-  SEL-13 Прототип сайта

Y

YouTrack

Issues | Dashboards Agile Boards Reports Projects More ▾

New issue ▾

MA

Everything ▾

Enter search request

Q

6-14

Created by Manager about 7 hours ago

Updated by Manager about 1 hour ago

Visible to issue readers ▾

3 ★

★

Выбор технологий

Определение технологического стека: использование ReactJS для динамического взаимодействия на фронтенде, Spring для быстрого обработки данных на бэкенде, выбор PostgreSQL в качестве базы данных.

Activity settings ▾

Manager

Updated about 2 hours ago

Assignee: Back-ender_2

Updated about 1 hour ago

Stage: Backlog → Underdevelopment

Kanban State: Ready to pull → Blocked

Updated about 1 hour ago

Actual time usage: ? → 4d

Stage: Underdevelopment → Done

MA

Write a comment, @mention people

Project

Site

Priority

Major

Assignee

Back-ender_1

Kanban State

Blocked

Stage

Done

Actual time usage

4d

Predict time usage

3d 2h

Boards

Lab2 Kanban ×

Y

YouTrack

Issues | Dashboards Agile Boards Reports Projects Knowledge Base More ▾

Create ▾

MA

Lab2 Kanban ▾

Filter cards on the board

Q

S

XL

TV

Backlog

4

Underdevelopment

3

Review

2

Test

3

Staging

2

Done

6

20 cards

S-28 Test - Интеграционное тестирование

Normal

Ready to

S-29 Test - Функциональное тестирование

Normal

Ready to

S-30 Release - Alpha и Beta тестирование

Normal

Ready to

S-32 Release - Развертывание сервера

Normal

Ready to

S-27 Backend - Безопасность и шифрование данных

Important

Blocked

S-23 Frontend - Панель управления пользователем

Major

Blocked

S-25 Backend - Проектирование и разработка API

Major

Blocked

S-22 Frontend - Страница "Документации"

Normal

Blocked

S-26 Backend - Аутентификация и управление правами доступа

Important

Blocked

S-21 Frontend - Страница "Центр поддержки"

Normal

Blocked

S-19 Frontend - Страница "Услуги"

Major

Blocked

S-20 Frontend - Страница "Продуктов"

Major

Blocked

S-15 Разрешение на обработку данных

Normal

Blocked

S-31 Release - Настройка SSL-сертификата

Normal

Blocked

6-13 Прототип сайта

Major

Blocked

6-14 Выбор технологий

Major

Blocked

6-16 Настройка хостинга и домена

Important

Blocked

6EL-17 Frontend - Страница "Главная"

Major

Blocked

6-18 Frontend - Страница "Входа/Регистрации"

Major

Blocked

6-24 Backend - Проектирование и настройка базы данных

Important

Blocked

☐	20 Open 0 Closed	Author -	Label -	Projects -	Milestones -	Assignee -	Sort -
☐	Release - Настройка SSL-сертификата #22 opened 1 hour ago						
☐	Release - Развертывание сервера #21 opened 1 hour ago						
☐	Release - Alpha и Beta тестирование #20 opened 1 hour ago						
☐	Test - Функциональное тестирование #19 opened 1 hour ago						
☐	Test - Интеграционное тестирование #18 opened 1 hour ago						
☐	Backend - Проектирование и разработка API #17 opened 1 hour ago						
☐	Backend - Проектирование и настройка базы данных #16 opened 1 hour ago						
☐	Backend - Безопасность и шифрование данных #15 opened 1 hour ago						
☐	Backend - Аутентификация и управление правами доступа #14 opened 1 hour ago						
☐	Frontend - Панель управления пользователем #13 opened 1 hour ago						
☐	Frontend - Страница "Входа/Регистрации" #12 opened 1 hour ago						
☐	Frontend - Страница "Документации" #11 opened 1 hour ago						
☐	Frontend - Страница "Центр поддержки" #10 opened 1 hour ago						
☐	Frontend - Страница "Услуг" #9 opened 1 hour ago						
☐	Frontend - Страница "Продуктов" #8 opened 1 hour ago						
☐	Frontend - Страница "Главная" #7 opened 1 hour ago						
☐	Настройка хостинга и домена #6 opened 1 hour ago						
☐	Разрешение на обработку данных #5 opened 1 hour ago						
☐	Выбор технологий #4 opened 1 hour ago						

Branches

New branch

OverviewYoursActiveStaleAll

Q Search branches...

Default

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	last week			Default	

Your branches

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
document	now		0	0	
backend	now		0	0	
frontend	now		0	0	
test	now		0	0	
develop	last week		0	0	

Active branches

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
document	now		0	0	
backend	now		0	0	
frontend	now		0	0	
test	now		0	0	
develop	last week		0	0	

7. Симулировать процесс разработки проекта

6-21 Created by Manager about 6 hours ago Updated by Manager just now Visible to issue readers 2

★ Frontend - Страница "Центр поддержки" Включает раздел часто задаваемых вопросов, форму отправки запросов и поддержку в реальном времени через чат.

Manager Updated about 1 hour ago Stage: Backlog → Test Kanban State: Ready to pull → Blocked Updated 3 minutes ago Predict time usage: 2w → 2w 1d 2h


Front-ender_2 Updated just now 6h 00m 25 Sep 2025 Development

Front-ender_2 Updated just now 6h 00m 26 Sep 2025 Development

Front-ender_2 Updated just now

Project Site Priority Normal Assignee Front-ender_2 Kanban State Blocked Stage Done Actual time usage 2w 1d Predict time usage 2w 1d 2h Boards Lab2 Kanban

8. После завершения снять метрики проекта и предоставить отчет

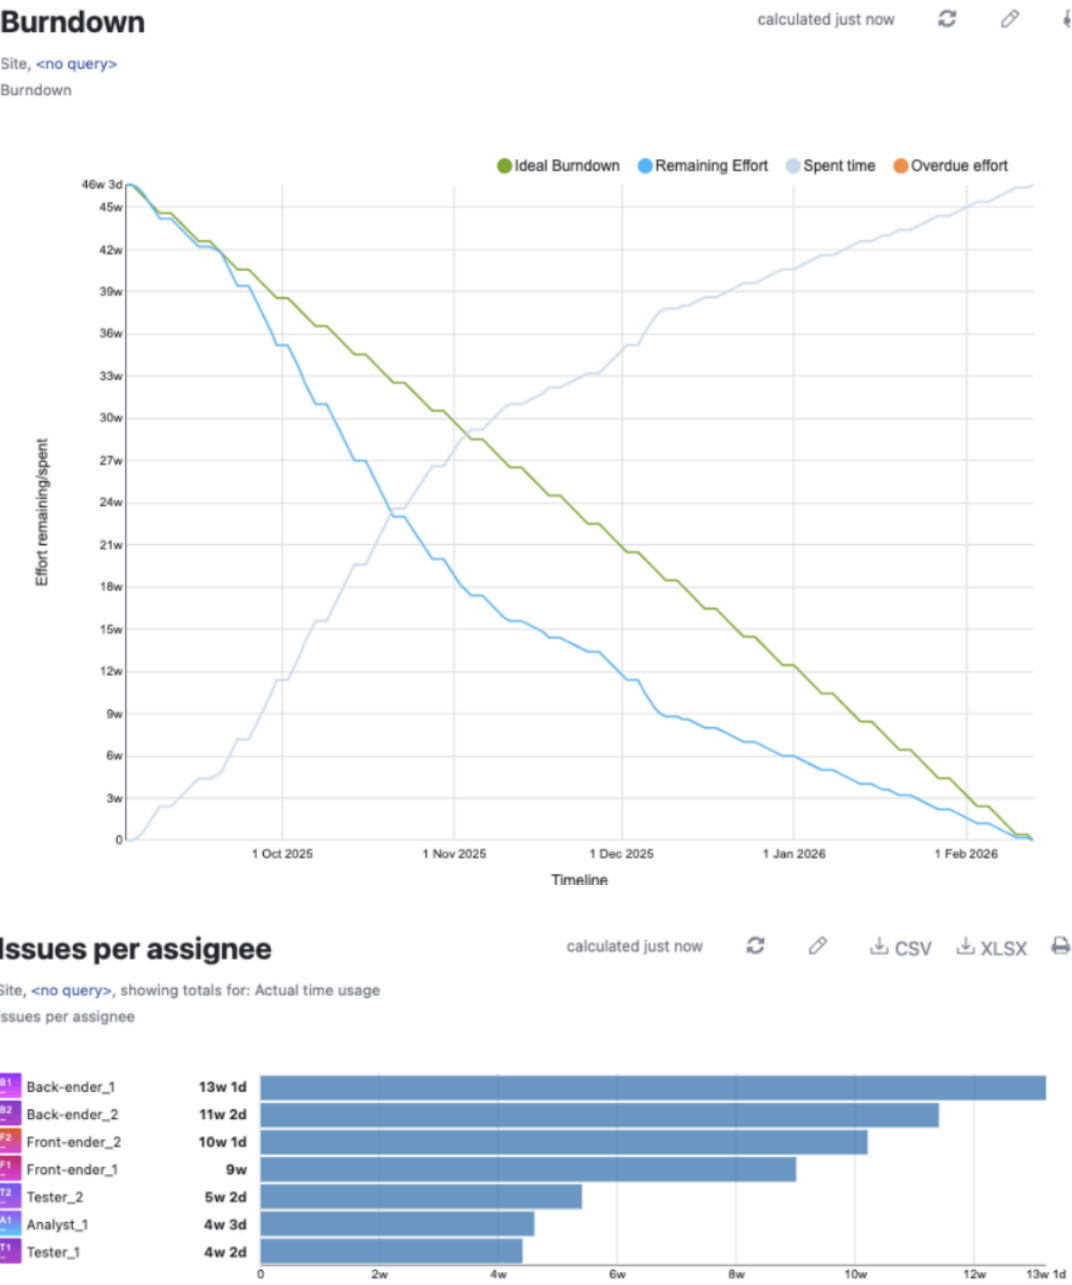

Time report

calculated just now



CSV



XLSX



Site, <no query>

Time report

per user per issue per project per work item ☐ Show work types ☐ Show remaining/total spent time

Issues		Time estimated	Time spent
Total time		1405h 00m	1398h 00m
SEL-13 Прототип сайта		70h 00m	72h 00m
SEL-14 Выбор технологий		20h 00m	24h 00m
SEL-15 Разрешение на обработку данных		150h 00m	138h 00m
SEL-16 Настройка хостинга и домена		50h 00m	48h 00m
SEL-17 Frontend - Страница "Главная"		68h 00m	66h 00m
SEL-18 Frontend - Страница "Входа/Регистрации"		48h 00m	48h 00m
SEL-19 Frontend - Страница "Услуг"		70h 00m	78h 00m
SEL-20 Frontend - Страница "Продуктов"		83h 00m	78h 00m
SEL-22 Frontend - Страница "Документации"		53h 00m	54h 00m
SEL-23 Frontend - Панель управления пользователем		98h 00m	108h 00m
SEL-24 Backend - Проектирование и настройка базы д...		90h 00m	84h 00m
SEL-25 Backend - Проектирование и разработка API		200h 00m	204h 00m
SEL-26 Backend - Аутентификация и управление права...		60h 00m	54h 00m
SEL-27 Backend - Безопасность и шифрование данных		60h 00m	66h 00m
SEL-28 Test - Интеграционное тестирование		60h 00m	60h 00m
SEL-29 Test - Функциональное тестирование		90h 00m	90h 00m
SEL-30 Release - Alpha и Beta тестирование		75h 00m	72h 00m
SEL-31 Release - Настройка SSL-сертификата		15h 00m	18h 00m
SEL-32 Release - Развертывание сервера		45h 00m	36h 00m

Gantt chart

You now have the option to work with an interactive Gantt chart that lets you update your project plan directly on the timeline.
If you use the option here to try it out, YouTrack copies the data from this report to create the interactive chart.
Don't worry about losing this report -- it will still be here until you decide to delete it.


[Go interactive](#) [Not now](#)

All projects, no query

Gantt chart

Duration 6w 4d

[Actual](#) [Estimated](#)

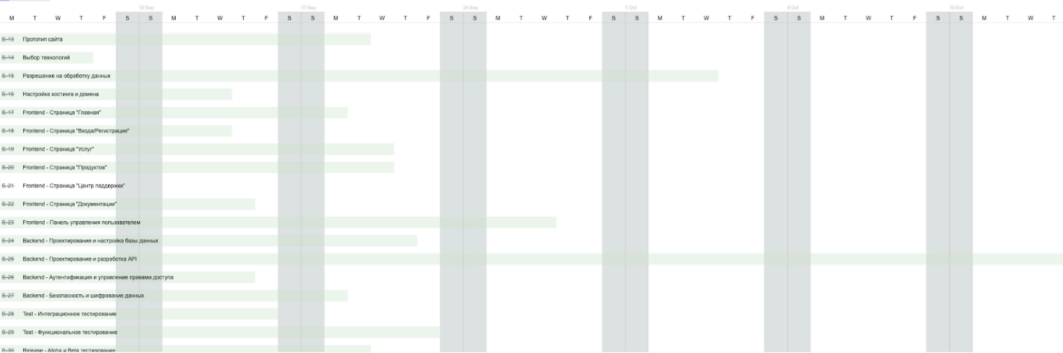

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы мы сконфигурировали YouTrack для работы в команде и выстроили план разработки проекта, при этом интегрировав github репозиторий с нашим YouTrack проектом.
